

Vand
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand



Haarup Vandværk

Attikavej 21
8530 Hjortshøj
DK

13. november 2025
Side 1 af 9

Tilsynsrapport 2025, Hårup Vandværk

Aarhus Kommune har den 12. november 2025 ført tilsyn på Hårup Vandværk. Tilsynet blev ført af Rikke Sølling. Tilstede for vandværket var formand Niels Peter Christensen og smed Henrik Sørensen.

TEKNIK OG MILJØ

By og Natur
Aarhus Kommune

Vandværket fremstår i fin vedligeholdelsesstand udvendig såvel som indvendigt.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Pejlinger

Der er ikke indberettet pejlinger til Jupiter-databasen siden henholdsvis 2004 (DGU nr. 79.820) og 2007 (DGU nr. 79.1435).

Der er monteret logger i begge borer, men loggeren er pt. ude af drift. Det er et vilkår i indvindingstilladelsen, at borerne pejles 4 gange årligt i ro og i drift.

For at pejlingerne kan anvendes i grundvandskortlægningen er det nødvendigt, at grundvandsspejlets kote er rimelig nøjagtig. Det skal derfor kontrolleres at borerne boringsfikspunkt og pejlemålepunkt er korrekt registreret i Jupiter, så grundvandsspejlets kote kan bestemmes.

I kan med fordel bruge GEUS lokaliseringsskema til indmålingen: [*formular-lok-skema-valgfrit.pdf \(geus.dk\)](https://geus.dk/lok-skema-valgfrit.pdf)

Aarhus kommune bistår gerne med at få indmålingen bliver korrekt indberettet til Jupiter. I skal blot sende indmålingen til rivs@aarhus.dk.

- Der henstilles til, at registreringen af boringsfikspunktet og pejlemålepunktet kontrolleres og om nødvendigt indmåles for begge borer.
- Der henstilles til, at pejlinger indberettes til kommunen i overensstemmelse med indvindingstilladelsen.

Takstblad

Hårup Vandværk har endnu ikke indsendt takstblad 2026 til godkendelse.

1. januar 2025 trådte en ny bekendtgørelse om anmeldelse og godkendelse af almene vandforsyningsregulativer og anlægs- og driftsbidrag i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter, at I skal indsende jeres takstblad til godkendelse senest 6 uger inden opkrævningsperioden starter dvs. senest den 20. november 2025. Hvis I ikke ændrer jeres takster, kan I nøjes med at anmelde dem.

Vand

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 24 96 78 59

Sag: GEO-2023-001450
Dokumentnummer:
15360769

Sagsbehandler:
Rikke Sølling



Dette skal ske senest 4 uger inden opkrævningsperioden starter dvs. senest den 4. december 2025.

13. november 2025
Side 2 af 9

- Der henstilles til at takstblad 2026 indsendes til godkendelse.

Afværgeboringen og evt. ny boring

Bestyrelsens overvejelser vedrørende afværgeboringen og evt. behov for øget råvandskapacitet blev drøftet. Hvis bestyrelsen ønsker at overbore og/eller at sløjfe afværgeboringen anbefales det, at I søger rådgiverbistand inden I indsender ansøgningen til Aarhus Kommune. Det samme sig gør sig gældende ved evt. ansøgning om ny boring.

Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til det fremsendte, er I velkomne til at skrive eller ringe.

Med venlig hilsen

Rikke Sølling
Geolog



Tilsynsrapport

13. november 2025
Side 3 af 9

Kommune	Aarhus	
Vandværk	Hårup Vandværk	
Tilsynsdato	12. november 2025	
Repræsentant vandværket	Niels Peter Christensen og Henrik Sørensen	
Tilsynsførende	Rikke Sølling, Aarhus Kommune	
Skema 1 – Boringer (1 skema pr. boring)		
DGU numre	DGU nr. 79.541, DGU nr. 79.820 og DGU nr. 79.1435 (ikke set)	
Bemærkninger	Ja: X	Nej
Skema 2 – Beholdere og vandbehandling		
Bemærkninger	Ja: X	Nej:
Skema 3 – Bygninger og inventar		
Bemærkninger	Ja: X	Nej:
Generelle bemærkninger: Vandværket fremstår generelt i pæn stand.		
Kontaktperson i forbindelse med driftsforstyrrelser: Navn: Niels Peter Christensen Telefonnummer: 2342 6315 / 8699 9315 E-mail: npc@mail.tele.dk Hjemmeside: www.haarupvand.dk		



Råvandsindvinding

Skema 1

13. november 2025

Side 4 af 9

Boring nr.:		DGU nr.:	79.541
Kildeplads:			
Indhegnet	Ja X	Nej	
Renholdt og ryddelig	Ja X	Nej	
10 m zone overholdt	Ja X	Nej	
25 m zone overholdt	Ja X	Nej	
Bemærkninger:			
Tørbrønd / overbygning / hus			
Aflåst dæksel eller lem	Ja X	Nej	
Ventilation	Ja	Nej X	
Tæt bund, sider og dæksel	Ja X	Nej	
Tætte rørgennemføringer	Ja X	Nej	
Terrænfald fra bygværk	Ja X	Nej	
Renholdt og ryddeligt	Ja X	Nej	
Bemærkninger:			
Boring / brønd			
Mærkning af boring	Ja X	Nej	
Pejlemulighed	Ja X	Nej	
Plac. af prøvetagningshane – OK	Ja X – inde på værket	Nej	
Vandtæt aflukning af borerør	Ja	Nej (X)	
Udluftningsstuds	Ja	Nej X	
Udluftning nedadvendt m. insektnet	Ja	Nej	
Bemærkninger: Boringen benyttes til afværgeoppumpning. Der er påvist en række forskellige pesticider, hvoraf nogle er over grænseværdien. Vandet fra afværgepumpningen ledes til bækken bag vandværket, som har udløb i Spørring Å. Tilladelse til udledning af pesticidforurenset vand er meddelt 6. april 2020. Borerøret er tæret, hvilket er forsøgt udbedret med en manchete.			



Råvandsindvinding

Skema 1

13. november 2025
Side 5 af 9

Boring nr.:		DGU nr.:	79.820
Kildeplads:			
Indhegnet	Ja	Nej X	
Renholdt og ryddelig	Ja X	Nej	
10 m zone overholdt	Ja X	Nej	
25 m zone overholdt	Ja X	Nej	
Bemærkninger:			
Tørbrønd / overbygning / hus			
Aflåst dæksel eller lem	Ja X	Nej	
Ventilation	Ja	Nej X	
Tæt bund, sider og dæksel	Ja X	Nej	
Tætte rørgennemføringer	Ja X	Nej	
Terrænfald fra bygværk	Ja X	Nej	
Renholdt og ryddeligt	Ja X	Nej	
Bemærkninger:			
Boring / brønd			
Mærkning af boring	Ja X	Nej	
Pejlemulighed	Ja X	Nej	
Plac. af prøvetagningshane – OK	Ja X – inde på værket	Nej	
Vandtæt aflukning af borerør	Ja X	Nej	
Udluftningsstuds	Ja	Nej X	
Udluftning nedadvendt m. insektnet	Ja	Nej	
Bemærkninger:			
Der er monteret logger i boringen. Loggeren er pt. ude af drift.			



13. november 2025
Side 6 af 9



DGU nr.: 79.541



DGU nr.: 79.820



Beholdere og vandbehandling

Skema 2

13. november 2025

Side 7 af 9

Iltning / Filteranlæg			
Luftindtag og ventilation beskyttet	Ja X	Nej	
Iltningsanlæg	Ja X - kompressor	Nej	
Tilsætningsanlæg	Ja	Nej X	
Åbne filteranlæg	Ja	Nej X	
Trykfilteranlæg	Ja X	Nej	
Tilstand af filteranlæg	God X	Acceptabel	Dårlig
Bemærkninger: 2 filtre som kører parallelt. Der er en samlet kapacitet på 50 m ³ /t. Råvandskapaciteten er ca. 22 m ³ /t. Der skylles 2-3 gange om ugen.			
Slambassin	Ja	Nej X	
Indhegnet	Ja	Nej	
Aflåst låge	Ja	Nej	
Renholdt og ryddeligt	Ja	Acceptabel	Nej
Bemærkninger: Filtrene skylles med råvand. Skyllevandet ledes direkte ud i bækken ved siden af vandværket. Der er ikke bundfældning inden udledning.			
Rentvandsbeholder – højdebeholder – vandtårn			
Indhegnet	Ja X	Nej	
Utætheder	Ja	Nej X	
Aflåst dør eller lem	Ja X	Nej	
Ventilationsåbn. beskyttet	Ja X	Nej	
Overløbsrør beskyttet	Ja	Nej	
Renholdt og ryddeligt	Ja X	Acceptabelt	Nej
Bemærkninger: Rentvandsbeholderen er en Perstrup betontank på 380 m ³ , og er placeret ca. 1 km fra vandværket i Hårup by. Det er muligt at koble om, således der køres direkte fra værket og på ledningsnettet udenom rentvandsbeholderen. Dækslet bliver visuelt inspiceret fra oven 1-2 gange om året. Selve beholderen er senest inspiceret i 2021 af JH DYK ApS. Aarhus Kommune anbefaler regelmæssig kontrol af rentvandsbeholdere hvert 5. år.			




Filtre



**Prøvehaner råvand (DGU 79.820)
og afværgéboring (DGU 79.541)**



Prøvehane råvand (DGU 79.1435)

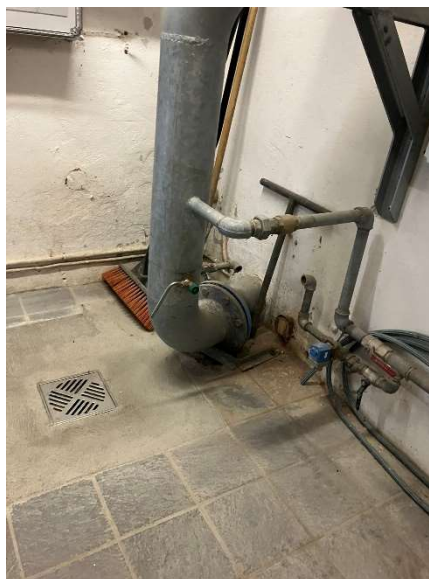

**Prøvehane afgang vandværk, pla-
ceret efter rentvandstank**

13. november 2025
Side 8 af 9



Bygninger og inventar

Skema 3

13. november 2025

Side 9 af 9

Vandværksbygning			
Aflåst	Ja X	Nej	
Luftindtag og ventilation beskyttet	Ja X	Nej	
Bemærkninger:			
Vedligeholdelsestilstand			
Udv. vedligeholdelse af bygning	God X	Acceptabel	Dårlig
Indv. vedligeholdelse af bygning	God X	Acceptabel	Dårlig
Råvandspumper Antal: 2 + 1	Dykpumper		
Rentvandspumper Antal: 3	God X	Acceptabel	Dårlig
Hydrofor Antal: 0	Ja	Nej	
Plac. af prøvetagningshane OK	Ja X	Nej	
Hjælpemaskiner f.eks. kompressor	God X	Acceptabel	Dårlig
Vandmålere	God X	Acceptabel	Dårlig
Andre instrumenter, herunder af-	God X	Acceptabel	Dårlig
Ventiler og styreorganer	God X	Acceptabel	Dårlig
Synlige rør	God X	Acceptabel	Dårlig
El-installation	God X	Acceptabel	Dårlig
Bemærkninger:			
Sikkerhedsforhold	Gode X	Acceptable	Dårlige
Bemærkninger: Vandværket har nødforbindelse til Aarhus Vand. Der skylles med 30 m ³ hver uge. Krajbjerg Vandværk har nødforsyning fra Hårup Vandværk.			
